

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA**

**FACULTAD DE INGENIERIA**

**2026**



**Milestone 1, primera entrega WiseTrip**

**Autores**

Isabella Rodríguez posada  
María Alejandra  
Gabriela Melo  
Valeria Cortes  
Santiago Andres Clavijo Suarez

**Fundamentos de ingeniería de software**

**Profesor**

Luis Gabriel Moreno Sandoval

**Fecha de entrega**

03 de septiembre de 2026

# 1. Introducción

El presente documento sintetiza el avance de WiseTrip durante las primeras tres semanas de desarrollo bajo una metodología de trabajo basada en Scrum. El propósito de este milestone fue transformar la propuesta inicial del producto en una primera estructura funcional, pasando progresivamente por la definición del alcance, la investigación de tecnologías externas, el diseño de los datos y, finalmente, la implementación inicial del backend.

Durante este proceso algunas decisiones planteadas inicialmente fueron modificadas al analizar con mayor detalle la viabilidad técnica y el tiempo disponible para el desarrollo. Por esta razón, además de registrar los resultados obtenidos en cada semana, se incluye una sección de Ajustes y mejoras, con el fin de mantener trazabilidad sobre los cambios realizados.

La documentación presentada describe las decisiones y avances del equipo; sin embargo, la implementación técnica de cada funcionalidad deberá verificarse directamente mediante las evidencias disponibles en el repositorio del proyecto.

## 2. Sprint – Semana 1: definición y planificación del proyecto

### 2.1. Objetivo de la semana

El objetivo principal de la primera semana fue establecer las bases funcionales, técnicas y organizativas de WiseTrip antes de iniciar su implementación.

WiseTrip fue definido como una plataforma orientada a centralizar la planificación de viajes y generar recomendaciones de destinos de acuerdo con el presupuesto y las preferencias del usuario, buscando reducir la necesidad de utilizar múltiples aplicaciones para organizar un viaje.

Durante esta etapa se trabajó principalmente en:

- definición del objetivo y propuesta de valor del producto;
- identificación de los usuarios objetivo;
- definición del problema;
- selección inicial de funcionalidades;
- definición de requerimientos funcionales y no funcionales;
- creación de historias de usuario y criterios de aceptación;
- priorización del Product Backlog;

- definición del alcance inicial;
- diseño del primer prototipo;
- planteamiento de la arquitectura;
- organización del repositorio de GitHub.

El Product Backlog fue priorizado según la importancia de las funcionalidades para conseguir una primera versión funcional del producto, permitiendo seleccionar progresivamente el trabajo de los siguientes Sprints.

## Evidencia

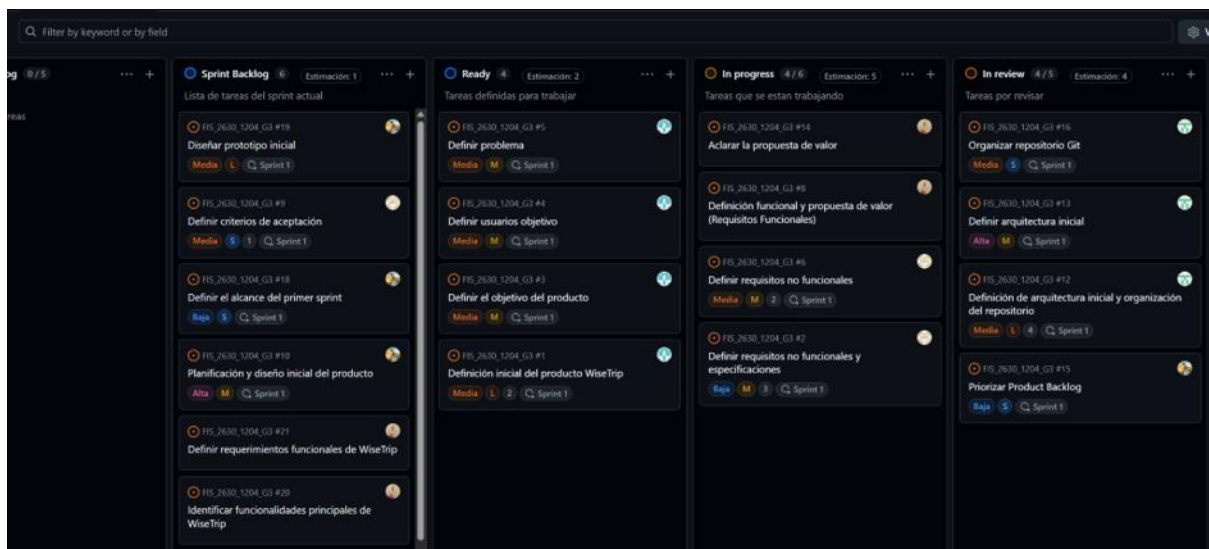


Figura 1. Organización inicial del Product Backlog de WiseTrip.

## 2.2. Arquitectura inicial

Se planteó inicialmente una arquitectura dividida en tres componentes principales:

Frontend → Backend → Servicios externos

El frontend sería responsable de la interacción con el usuario; el backend concentraría la lógica del negocio, gestión de información y comunicación con la base de datos; mientras que los servicios externos proporcionarían información obtenida mediante APIs.

Esta arquitectura sirvió posteriormente como referencia para distribuir las responsabilidades de desarrollo entre los integrantes del equipo.

## Evidencia

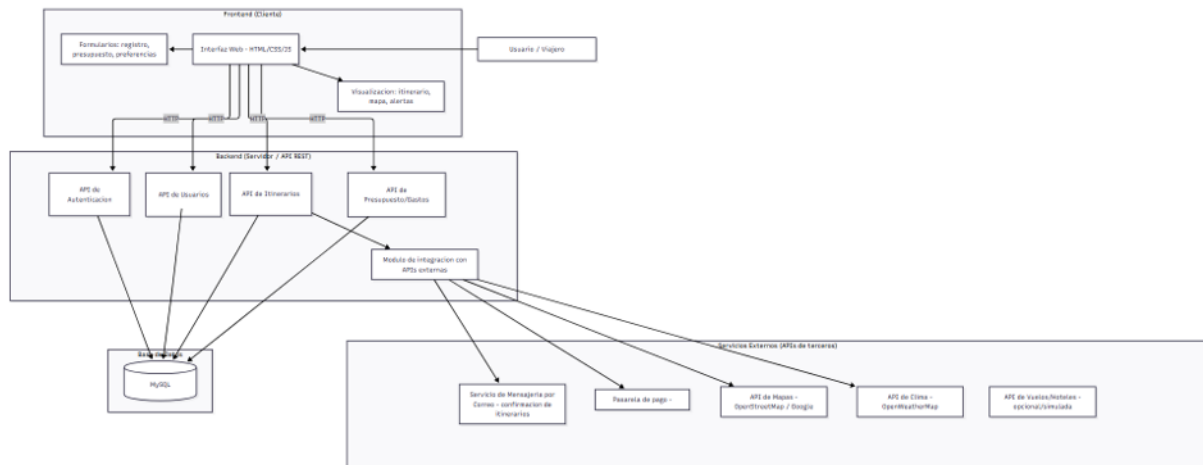


Figura 2. Arquitectura inicial propuesta para WiseTrip.

### 2.3. Diseño inicial de la interfaz

También se realizó una primera aproximación visual de la plataforma. El objetivo del prototipo era definir la distribución de las principales funcionalidades antes de iniciar su programación.

Dentro de este diseño se contemplaron elementos relacionados con presupuesto, itinerarios, clima, recomendaciones, destinos y demás información relacionada con el viaje.

Este prototipo se consideró una referencia conceptual, por lo que no representa necesariamente la interfaz definitiva del producto.

## Evidencia



WiseTrip

Inicio

Mis viajes

Explorar destinos

Presupuesto

Perfil



PANEL DEL VIAJERO

Hola, Andrea 🖐️

Esto es todo lo que necesitas saber sobre tu próximo viaje, en un solo lugar.

+ Planear nuevo viaje

→ Próximo viaje

Cartagena

Bolívar, Colombia

TU VIAJE A CARTAGENA

6 días de sol, historia y mar Caribe

SALIDA  
Sáb, 14 sept

REGRESO  
Vie, 20 sept

VIAJEROS  
2 adultos

HOSPEDAJE  
Hotel Getsemaní

Faltan  
12 días

Ver detalles del viaje

Resumen del viaje

Presupuesto, reservas y clima, todo sincronizado en tiempo real



Presupuesto total

\$3.500.000

COP · 2 viajeros



Gastado

\$1.240.000

35% del presupuesto



Restante

\$2.260.000

Disponible para gastar



Próximo vuelo

AV 204 ·  
08:40 AM

BOG → CTG · 14 sept



Clima en Cartagena

31°C Soleado

31° 29° 32° 27°  
Sáb Dom Lun Mar



Duración del viaje

6 días

5 noches · 14-20 sept

Itinerario diario

Ver itinerario completo

+ Agregar actividad

Día 1 · Sáb

Día 2 · Dom

Día 3 · Lun

Día 4 · Mar

Día 5 · Mié

Día 6 · Jue

09:00



Check-in Hotel Getsemaní

Barrio Getsemaní, Cartagena

HOSPEDAJE

11:30



Recorrido Ciudad Amurallada

Centro Histórico

CULTURA

13:30



Almuerzo en La Cevichería

Calle Stuart, Centro

GASTRONOMÍA

16:00



Atardecer en el Castillo San Felipe

Cerro San Lázaro

CULTURA

20:00



Cena y música en vivo

Plaza Santo Domingo

DESCANSO

Mapa del destino

Pantalla completa

- Hospedaje
- Restaurantes
- Itinerario
- Puntos de interés

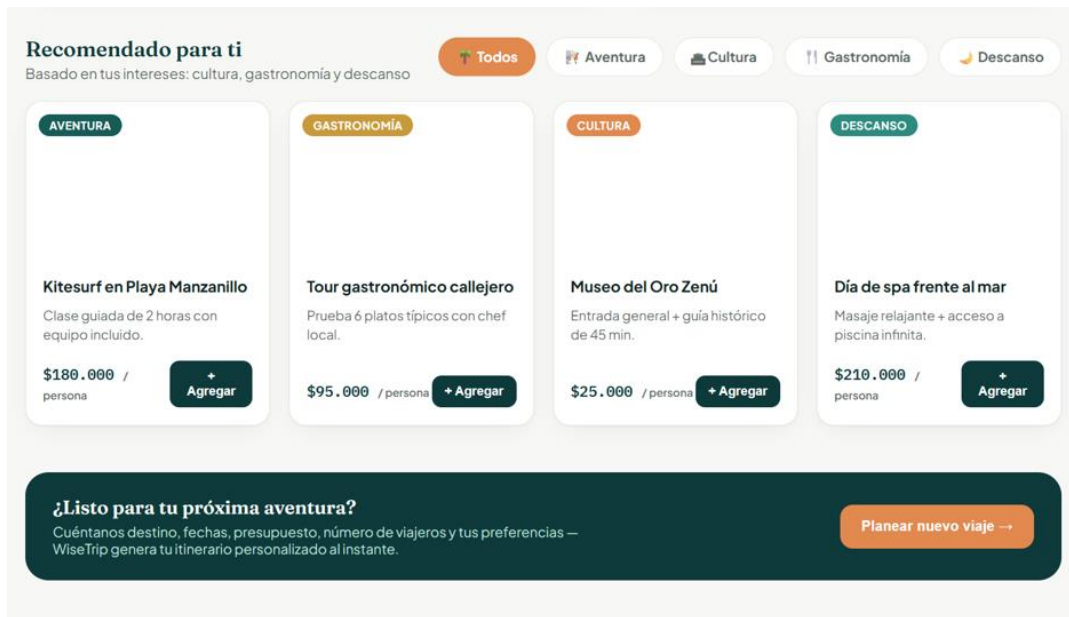


Figura 3. Primera propuesta visual de la plataforma.

## 3. Sprint – Semana 2: investigación técnica y diseño de la solución

### 3.1. Objetivo de la semana

Durante la segunda semana el equipo pasó de la definición conceptual a la evaluación de las herramientas necesarias para desarrollar las funcionalidades planteadas.

El trabajo se concentró principalmente en:

- investigación y selección de APIs;
- delimitación técnica del alcance;
- análisis inicial de la base de datos;
- definición de la información necesaria para generar recomendaciones;
- evolución del diseño de las pantallas de la aplicación.

## 3.2. Investigación y selección de APIs

Debido a que WiseTrip depende de información externa relacionada con destinos, lugares, actividades y clima, fue necesario analizar diferentes proveedores antes de comenzar la implementación.

### API de lugares, hoteles, restaurantes y actividades

Inicialmente se contempló utilizar diferentes servicios para hoteles, restaurantes y actividades. Sin embargo, después de evaluar alternativas como Google Maps, Foursquare, OpenTripMap y otros proveedores, el equipo decidió centralizar estas consultas mediante Geoapify.

Geoapify permite consultar categorías de alojamiento, restaurantes, turismo y diferentes puntos de interés utilizando coordenadas geográficas y radios de búsqueda. Además, permite manejar estos servicios desde un mismo proveedor y con un mismo formato de respuesta.

Esta decisión fue importante porque redujo la complejidad que habría implicado integrar múltiples APIs para funcionalidades relacionadas.

### API de clima

También se realizó una comparación entre diferentes servicios meteorológicos, incluyendo Meteosource, OpenWeatherMap, WeatherAPI, Open-Meteo y Weatherbit.

Como resultado de la investigación se seleccionó inicialmente Meteosource, principalmente por su cobertura, posibilidades de integración y disponibilidad de información meteorológica útil para el proyecto.

Sin embargo, debido a la priorización del alcance de la primera versión de WiseTrip, la implementación del módulo climático no se convirtió en una prioridad inmediata. La investigación realizada se conserva como referencia para una integración posterior.

### Pasarela de pagos

Durante esta semana también se investigaron alternativas de pasarelas de pago como Mercado Pago, Wompi y PayU, evaluando cobertura en Latinoamérica, métodos de pago, costos y posibilidades de integración.

Como resultado del análisis, Mercado Pago fue considerada inicialmente la alternativa más adecuada para WiseTrip por su cobertura regional y disponibilidad de herramientas de prueba.

No obstante, esta investigación corresponde a una decisión de diseño y análisis técnico, y no implica que la pasarela de pagos haya sido implementada durante este milestone.

### 3.3. Primera propuesta de base de datos

Durante la segunda semana se planteó un primer modelo de datos compuesto principalmente por las entidades:

- Usuario.
- Viaje.
- Preferencias.

En este modelo se establecieron reglas como la unicidad del correo electrónico, la relación entre usuarios y viajes, la validación de fechas y presupuesto y la relación de diferentes preferencias con un viaje.

#### Evidencia

Modelo entidad relación inicial

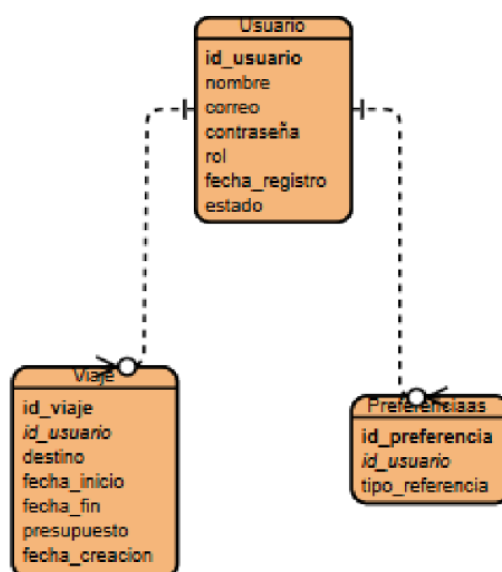


Figura 5. Primera propuesta del modelo de datos de WiseTrip.

Este modelo permitió comprender inicialmente las relaciones principales del sistema, pero no se mantuvo como diseño definitivo, debido a que durante la implementación surgieron nuevas necesidades asociadas al algoritmo de recomendación de destinos.

## 3.4. Evolución del diseño de la interfaz


Paralelamente a las decisiones de backend, se continuó definiendo la navegación que tendría el usuario.

Para la primera versión funcional se priorizaron las pantallas necesarias para completar el flujo inicial:

Ingreso del usuario → presupuesto → preguntas de preferencias → recomendación de destinos.

A partir de esta delimitación se comenzó a transformar el prototipo general de la Semana 1 en pantallas más específicas y realizables dentro del tiempo disponible.

### Evidencia

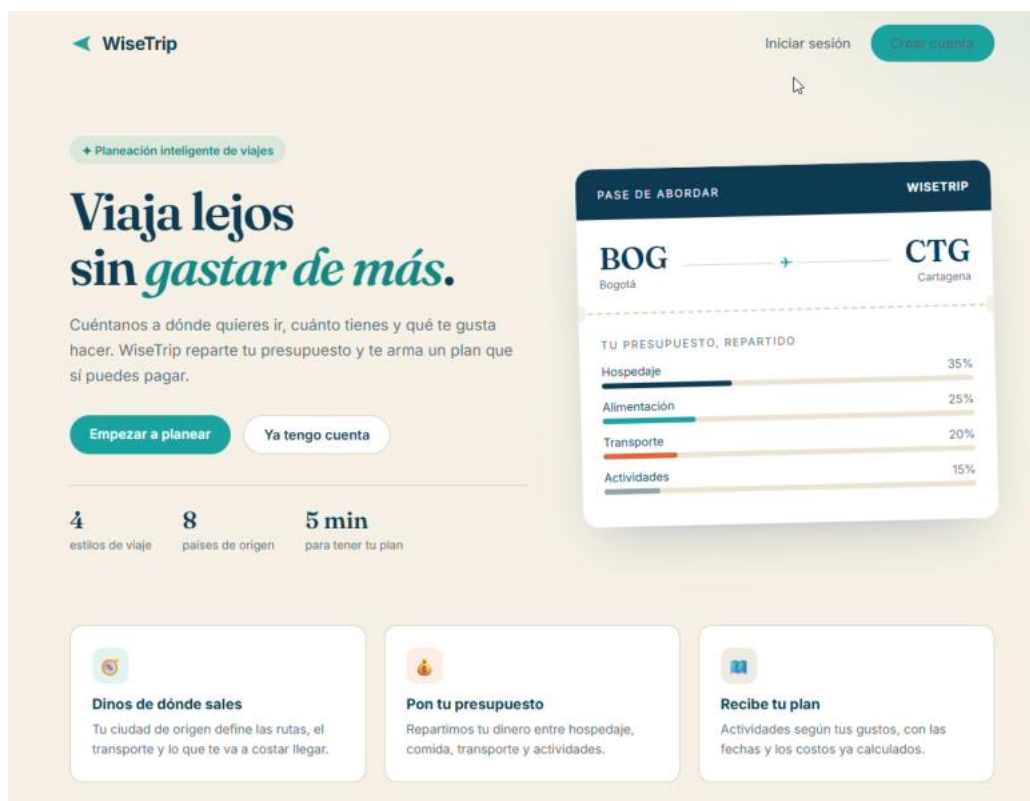

[← Volver al inicio](#)

## Crea tu cuenta

Empieza a planear tu proximo viaje en minutos.

NOMBRE COMPLETO

TIPO DE DOCUMENTO

Cedula de ciudadanía

NUMERO DE DOCUMENTO

FECHA DE NACIMIENTO

CORREO ELECTRONICO

CONTRASEÑA

CONFIRMAR CONTRASEÑA

Crear cuenta

Ya tienes cuenta? [Inicia sesion](#)

✓

## Cuenta creada con exito

Hola María Alejandra Rodríguez, tu cuenta [malejarodribeta@gmail.com](#) ya esta lista. Ahora inicia sesion para continuar con la planificacion de tu viaje.

[Ir a iniciar sesion](#)

[← Volver al inicio](#)

## Bienvenido de vuelta

Inicia sesion para continuar con la configuracion de tu viaje.

CORREO ELECTRONICO

CONTRASEÑA

Iniciar sesion

No tienes cuenta? [Crea una aqui](#)

Figura 6. Diseño actualizado de login

ORIGEN

PREFERENCIAS

FECHAS

PRESUPUESTO

## ¿Qué tipo de viajero eres?

Responde sí o no a cada pregunta. Con esto WiseTrip elige destinos y actividades que de verdad te gusten. Son 26 preguntas rápidas.

1

**Tipo de destino**  
Qué clase de lugar quieres visitar

¿Te gustaría que tu viaje incluya playa?

Sí

No

¿Te gustaría visitar zonas de montaña?

Sí

No

¿Te interesa estar en contacto con la naturaleza (parques, reservas, bosques)?

Sí

No

2

**Clima**  
La temperatura que prefieres durante el viaje

¿Prefieres un destino de clima cálido?

Sí

No

¿Prefieres un destino de clima frío?

Sí

No

¿Te gustaría que tu destino tenga nieve?

Sí

No

3

**Aventura**  
Qué tanta actividad física y adrenalina buscas

1 de 26 respondidas

Continuar

Hola, María Alejandra Rodríguez

Cerrar sesión

ORIGEN

PREFERENCIAS

FECHAS

PRESUPUESTO

## ¿Cuándo viajas?

Con las fechas calculamos cuántos días dura el viaje y cómo repartir tu presupuesto.

FECHA DE INICIO

16/09/2026

FECHA DE REGRESO

dd/mm/aaaa

Continuar

Volver a preferencias

septiembre de 2026

DO LU MA MI JU VI SA

30 31 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

Borrar Hoy

Hola, María Alejandra Rodríguez

Cerrar sesión

## Destinos recomendados

Estos son los 3 destinos que mejor coinciden contigo.

1

**Medellín**  
COLOMBIA

COINCIDENCIA

58%

Presupuesto 70% · Gustos 50%

2

**Ciudad de México**  
MÉXICO

COINCIDENCIA

54%

Presupuesto 70% · Gustos 43%

3

**Cartagena**  
COLOMBIA

COINCIDENCIA

54%

Presupuesto 70% · Gustos 43%

Los puntajes combinan qué tanto se ajusta el costo del destino a tu presupuesto (40%) y cuántas de tus preferencias cumple (60%).

Volver al resumen

*Figura 7. Diseño de presupuesto/preguntas*



FIGURA 8. Diseño de resultados o destinos recomendados

## 4. Sprint – Semana 3: implementación del backend y consolidación de la base de datos

### 4.1. Objetivo de la semana

Durante la tercera semana se inició la transición desde los diseños e investigaciones hacia una implementación funcional.

El objetivo fue desarrollar la estructura principal del backend, finalizar el modelo de datos requerido para la primera entrega y comenzar la integración entre la lógica de recomendación, la información almacenada y los servicios externos.

### 4.2. Implementación del backend

Se comenzó la implementación de la lógica principal de WiseTrip en código.

Para la primera versión del sistema se priorizó el flujo encargado de:

1. recibir la información inicial del usuario;
2. obtener su presupuesto;

3. registrar sus respuestas de preferencias;
4. comparar dichas preferencias con las características de las ciudades;
5. calcular cuáles destinos presentan mayor coincidencia;
6. devolver al usuario un grupo reducido de destinos recomendados.

De esta manera, el desarrollo dejó de enfocarse únicamente en funcionalidades independientes y comenzó a concentrarse en completar un flujo funcional de principio a fin.

## Evidencia

|                  |   |                                    |       |
|------------------|---|------------------------------------|-------|
| /                |   | Portada                            |       |
| /registro        | → | /registro-exitoso                  | HU#22 |
| /login           | → |                                    | HU#23 |
| /origen          | → |                                    | HU#24 |
| /preferencias    | → |                                    | HU#25 |
| /fechas          | → |                                    | HU#26 |
| /presupuesto     | → |                                    | HU#27 |
| /resumen         |   | Consolidado de toda la información |       |
| /recomendaciones |   | Destinos sugeridos                 |       |

*Figura 9. Organización inicial del backend de WiseTrip.*

## 4.3. Consolidación de la base de datos

Durante la implementación se identificó que el modelo planteado en la Semana 2 era insuficiente para representar la lógica real de recomendación.

Por esta razón, el diseño de datos fue ajustado para incorporar información relacionada con:

- ciudades disponibles;
- coordenadas geográficas;
- características o atributos de cada ciudad;
- preferencias o preguntas utilizadas por el sistema;
- relaciones entre ciudades y atributos;
- información requerida por el algoritmo para generar recomendaciones.

El cambio permitió que la base de datos dejara de representar únicamente al usuario y sus viajes y comenzara a servir también como soporte para la lógica de selección de destinos.

## Evidencia

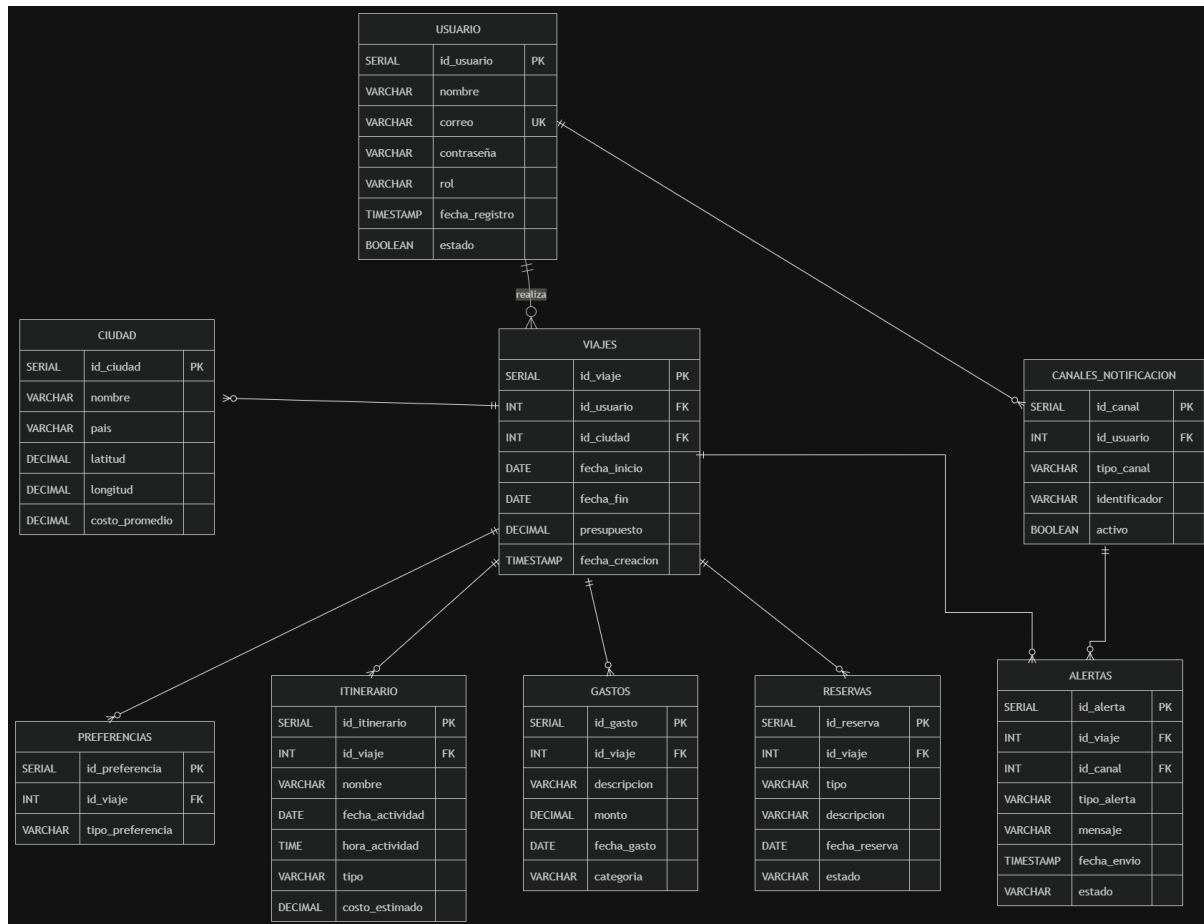


Figura 12. Evidencia de la implementación de la base de datos.

## 4.4. Integración inicial con Geoapify

La investigación realizada durante la Semana 2 comenzó a trasladarse al código mediante la conexión con Geoapify.

La lógica planteada consiste en utilizar las coordenadas de las ciudades para realizar consultas de puntos de interés y obtener información que pueda complementar las recomendaciones ofrecidas por WiseTrip.

La investigación técnica ya había establecido que Geoapify retorna información en formato GeoJSON y que las solicitudes pueden variar según las coordenadas y categorías consultadas.

Durante la implementación también se realizaron ajustes para reducir la cantidad de solicitudes necesarias y facilitar el procesamiento posterior de las categorías.

## 5. Ajustes y mejoras realizadas durante el milestone

El desarrollo de WiseTrip no siguió exactamente todas las decisiones realizadas durante la primera semana. A medida que avanzó la investigación y comenzó la implementación fue necesario modificar algunos elementos para mantener un alcance viable.

### 5.1. Reducción del alcance

La propuesta inicial contemplaba una plataforma con un número considerable de funcionalidades. Durante las siguientes semanas se decidió priorizar aquellas necesarias para demostrar el funcionamiento principal del producto.

El alcance geográfico también fue delimitado a destinos de Latinoamérica, en lugar de desarrollar inicialmente una plataforma de alcance global. Esta delimitación ya fue considerada durante la selección de las APIs.

### 5.2. Cambio en la estrategia de APIs

Inicialmente se contemplaba utilizar diferentes proveedores para mapas, restaurantes, hospedajes y actividades.

Después de la investigación se decidió utilizar Geoapify como proveedor principal para información geográfica y puntos de interés, reduciendo la cantidad de integraciones necesarias.

### 5.3. Cambio del modelo de base de datos

El modelo de Usuario–Viaje–Preferencias realizado durante la Semana 2 funcionó como una primera aproximación.

Con la implementación del algoritmo fue necesario replantearlo para incluir las ciudades, sus atributos y la información utilizada durante el proceso de recomendación.

Por lo tanto, el modelo presentado inicialmente no fue eliminado de la trazabilidad del proyecto, sino que se conserva como evidencia de una decisión que posteriormente fue modificada.

## 5.4. Priorización de funcionalidades

Algunas funcionalidades investigadas, como el clima y la pasarela de pagos, permanecen dentro de la visión general de WiseTrip, pero su implementación fue pospuesta para concentrar el esfuerzo de este milestone en completar primero el núcleo de la aplicación:

usuario → presupuesto → preferencias → procesamiento → destinos recomendados.

## 5.5. Evolución del diseño

El prototipo inicial mostraba una versión amplia de la plataforma terminada. Durante las semanas posteriores fue necesario adaptar este diseño a las funcionalidades que realmente serían desarrolladas en la primera versión.

Por esta razón, las nuevas pantallas se diseñaron alrededor del flujo que actualmente se encuentra en implementación y podrán continuar evolucionando en los siguientes Sprints.

# 6. Resultado del milestone

Al finalizar las tres primeras semanas, el proyecto evolucionó desde una propuesta conceptual hasta una primera estructura técnica implementada.

Los principales resultados obtenidos fueron:

- definición del producto y de su alcance inicial;
- construcción y organización del Product Backlog;
- definición de historias de usuario y criterios de aceptación;
- creación del repositorio y organización del trabajo mediante GitHub;
- elaboración del primer prototipo;
- investigación y selección de APIs;
- selección de Geoapify para información geográfica y puntos de interés;
- análisis de alternativas para clima y pagos;
- elaboración y posterior ajuste del modelo de datos;

- implementación inicial del backend;
- creación de la base de datos necesaria para soportar la lógica actual;
- implementación inicial del sistema encargado de procesar preferencias y recomendar destinos.

El milestone permitió además identificar diferencias entre lo diseñado inicialmente y las necesidades encontradas durante el desarrollo. Estos cambios hacen parte natural del proceso iterativo y servirán como base para organizar los siguientes Sprints.

## 7. Evidencias del desarrollo

La verificación técnica de los avances documentados puede realizarse directamente en el repositorio de WiseTrip, donde se encuentran los issues, milestones, ramas, commits y código desarrollado por los integrantes del equipo.

### **Repositorio:**

[Repositorio](#)

### **Milestone:**

[Prototipo funcional y conexión a la base de datos](#)

Evidencias adicionales:

No Status11Estimación: 45

FIS\_2630\_1204\_G3 #66

Configurar el servicio del clima

Media M5

Sprint 2

FIS\_2630\_1204\_G3 #67

Verificar funcionamiento

Media M4

Sprint 2

FIS\_2630\_1204\_G3 #64

Realizar consulta del clima

Baja M3

Sprint 2

FIS\_2630\_1204\_G3 #58

HU#11-Como viajero quiero consultar el clima del destino que elegí, para saber qué

Product Backlog0/5

Estimación: 0

Lista General de tareas

Sprint Backlog5Estimación: 0

Lista de tareas del sprint actual

FIS\_2630\_1204\_G3 #137

Daily sprint "3/09/2026"

FIS\_2630\_1204\_G3 #138

Daily sprint "4/09/2026"

FIS\_2630\_1204\_G3 #139

Sprint review

FIS\_2630\_1204\_G3 #143

Integrar ubicación y aeropuerto de origen

FIS\_2630\_1204\_G3 #141

In progress12/6Estimación: 46

Tareas que se estan trabajando

FIS\_2630\_1204\_G3 #136

Daily sprint "2/09/2026"

Sprint 4

FIS\_2630\_1204\_G3 #153

Unificar los nombres de nivel de costo

FIS\_2630\_1204\_G3 #151

Control de creditos de ejecucion de Geoapify

FIS\_2630\_1204\_G3 #150

Unificar los nombres de nivel de costo

Ready0Estimación: 0

Tareas definidas para trabajar

In review2/5Estimación: 4

Tareas por revisar

FIS\_2630\_1204\_G3 #149

Corregir ortografia del codigo

FIS\_2630\_1204\_G3 #145

Cambiar lenguaje para unir codigos

Alta M4

Sprint 4

+ Add item

Done91Estimación: 193

Lista de tareas completadas

FIS\_2630\_1204\_G3 #68

Daily Sprint [19/08/2026]

FIS\_2630\_1204\_G3 #94

Diseñar e implementar formulario de registro

Baja S

Sprint 3

FIS\_2630\_1204\_G3 #95

Implementar validaciones y lógica de registro

Baja S

Sprint 3

FIS\_2630\_1204\_G3 #106

Implementar selector de fechas

Alta L7

Sprint 3

| <input type="checkbox"/> | 0 Open | ✓ 19 Closed | Author                                                                                                                                                        | Label  | Projects | Milestones | Reviews | Assignee                                                                            | Sort                                                                                                                      |
|--------------------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> |        |             |  Develop                                                                     |        |          |            |         |                                                                                     |                                                                                                                           |
|                          |        |             | #158 by MalejaRodri                                                                                                                                           | Member |          |            |         |                                                                                     | was merged 17 hours ago                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> |        |             |  entrega pantallas de wisetrip1                                              |        |          |            |         |                                                                                     |                                                                                                                           |
|                          |        |             | #157 by MalejaRodri                                                                                                                                           | Member |          |            |         |                                                                                     | was merged 18 hours ago                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> |        |             |  cambios codigo                                                              |        |          |            |         |                                                                                     |                                                                                                                           |
|                          |        |             | #156 by MalejaRodri                                                                                                                                           | Member |          |            |         |                                                                                     | was merged 18 hours ago                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> |        |             |  docs(db): actualizacion estructura base de datos                            |        |          |            |         |  |  1                                     |
|                          |        |             | #155 by valeriacortess                                                                                                                                        | Member |          |            |         |                                                                                     | was merged yesterday  Milestone 1 — P... |
| <input type="checkbox"/> |        |             |  docs: agregar documentos de la semana 3                                     |        |          |            |         |  |                                                                                                                           |
|                          |        |             | #134 by valeriacortess                                                                                                                                        | Member |          |            |         |                                                                                     | was merged 3 days ago                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> |        |             |  docs(db):actualizar modelo de base de datos                                 |        |          |            |         |                                                                                     |                                                                                                                           |
|                          |        |             | #133 by valeriacortess                                                                                                                                        | Member |          |            |         |                                                                                     | was merged 3 days ago                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> |        |             |  Feat: Agregar programa de recomendacion de destinos                         |        |          |            |         |                                                                                     |                                                                                                                           |
|                          |        |             | #131 by Santiago-Clavijo                                                                                                                                      | Member |          |            |         |                                                                                     | was merged 4 days ago                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> |        |             |  HU#22, HU#23 y HU#24 — Registro, login y ubicación de origen en Spring Boot |        |          |            |         |                                                                                     |                                                                                                                           |
|                          |        |             | #130 by MalejaRodri                                                                                                                                           | Member |          |            |         |                                                                                     | was merged 4 days ago                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> |        |             |  docs: agregar informe de Preguntas de preferencia                           |        |          |            |         |                                                                                     |                                                                                                                           |
|                          |        |             | #129 by GabrielaMeloG                                                                                                                                         | Member |          |            |         |                                                                                     | was merged 4 days ago                                                                                                     |

PULL REQUESTS

